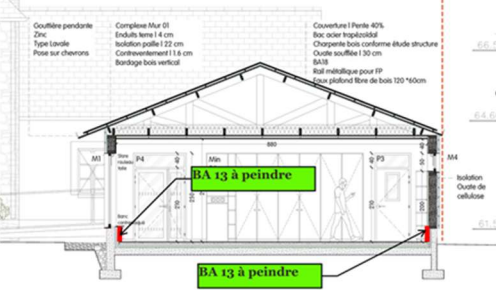


QUESTION DU 17/07/2026	Ht faïence local ménage et sanitaires incohérence cctp et plan de repérage? Mur paille reste t-il apparent, sur les plans de repérage vous ajoutez une ba 13+peinture? Boiseries prévues à peindre au lot menuiserie, prévoit on ce poste en option
REPONSE DU 17/07/2026	• Il y'a en effet une incohérence, chiffrer peinture toute hauteur dans le local ménage + peinture au dessus de la faïence (entre 2m et 2.60m) dans les sanitaires PMR ; • Le mur paille reste apparent, seul l'habillage des BA 13 en pied de mur est à peindre (cf. coupes et détails)  • oui, chiffrer les peintures des boiseries en option (plinthes à peindre, tablettes et portes à vernir)
