N°	Nom de la tâche	Durée
1	**AVP**	**66 jours**
21	**AMO Missions complémentaires**	**70 jours**
27	**Permis de construire 1**	**135 jours**
35	**Permis de construire 2**	**135 jours**
43		
44	**ACT 1**	**220 jours**
56		
57	**VISA 1**	**80 jours**
64		
65	**DET 1**	**160 jours**
71		
72	**AOR 1**	**60 jours**
79		
80	**ACT 2**	**280 jours**
81	Réalisation du DCE	1,2 mois
82	Relecture + pièces administratives	1 mois
83	Dépôt du DCE en ligne	0 jour
84	Etude par les entreprises	4,5 mois
85	Remise des offres	0 jour
86	Analyse des offres	3 sm
87	Questions/réponses	3 sm
88	Finalisation analyse des offres	3 sm
89	**CAO choix candidat**	**0 mois**
90	**Conseil Syndical**	0 jour
91	Mise au point du marché	16 sm
92	Notification du marché	0 jour
93		
94	**VISA 2**	**80 jours**
95	Ordre de service préparation	0 mois
96	Planning opération et financier	0,5 mois
97	Note de calcul	10 jours
98	Plans d'execution EQUIPEMENT	2 mois
99	Plans d'execution GENIE CIVIL	2 mois
100	VISA des plans	4 mois
101		
102	**DET 2**	**150 jours**
103	Ordre de service travaux site siloret	0 jour
104	Réalisation des travaux site siloret	4 mois
105	Réalisation des travaux site siloret	3,5 mois
106	Suivi du MOE	7,5 mois
107	Constat d'achèvement des travaux	0 jour
108	Ordre de service travaux site Houssa	0 jour
109	Réalisation des travaux site Houssa	2 mois
110	Réalisation des travaux site Houssa	4 mois
111	Suivi du MOE	6 mois
112	Constat d'achèvement des travaux	0 jour
113		
114	**AOR 2**	**70 jours**
115	Ordre de service Mise en Route	0 jour
116	Mise en route	2 sm
117	Mise en service	4 sm
118	Mise en observation	8 sm
119	Suivi MOE	14 sm
120	**Réception des installations**	0 jour
121		
122	**DOSSIERS REGLEMENTAIRES**	**1339 jours**

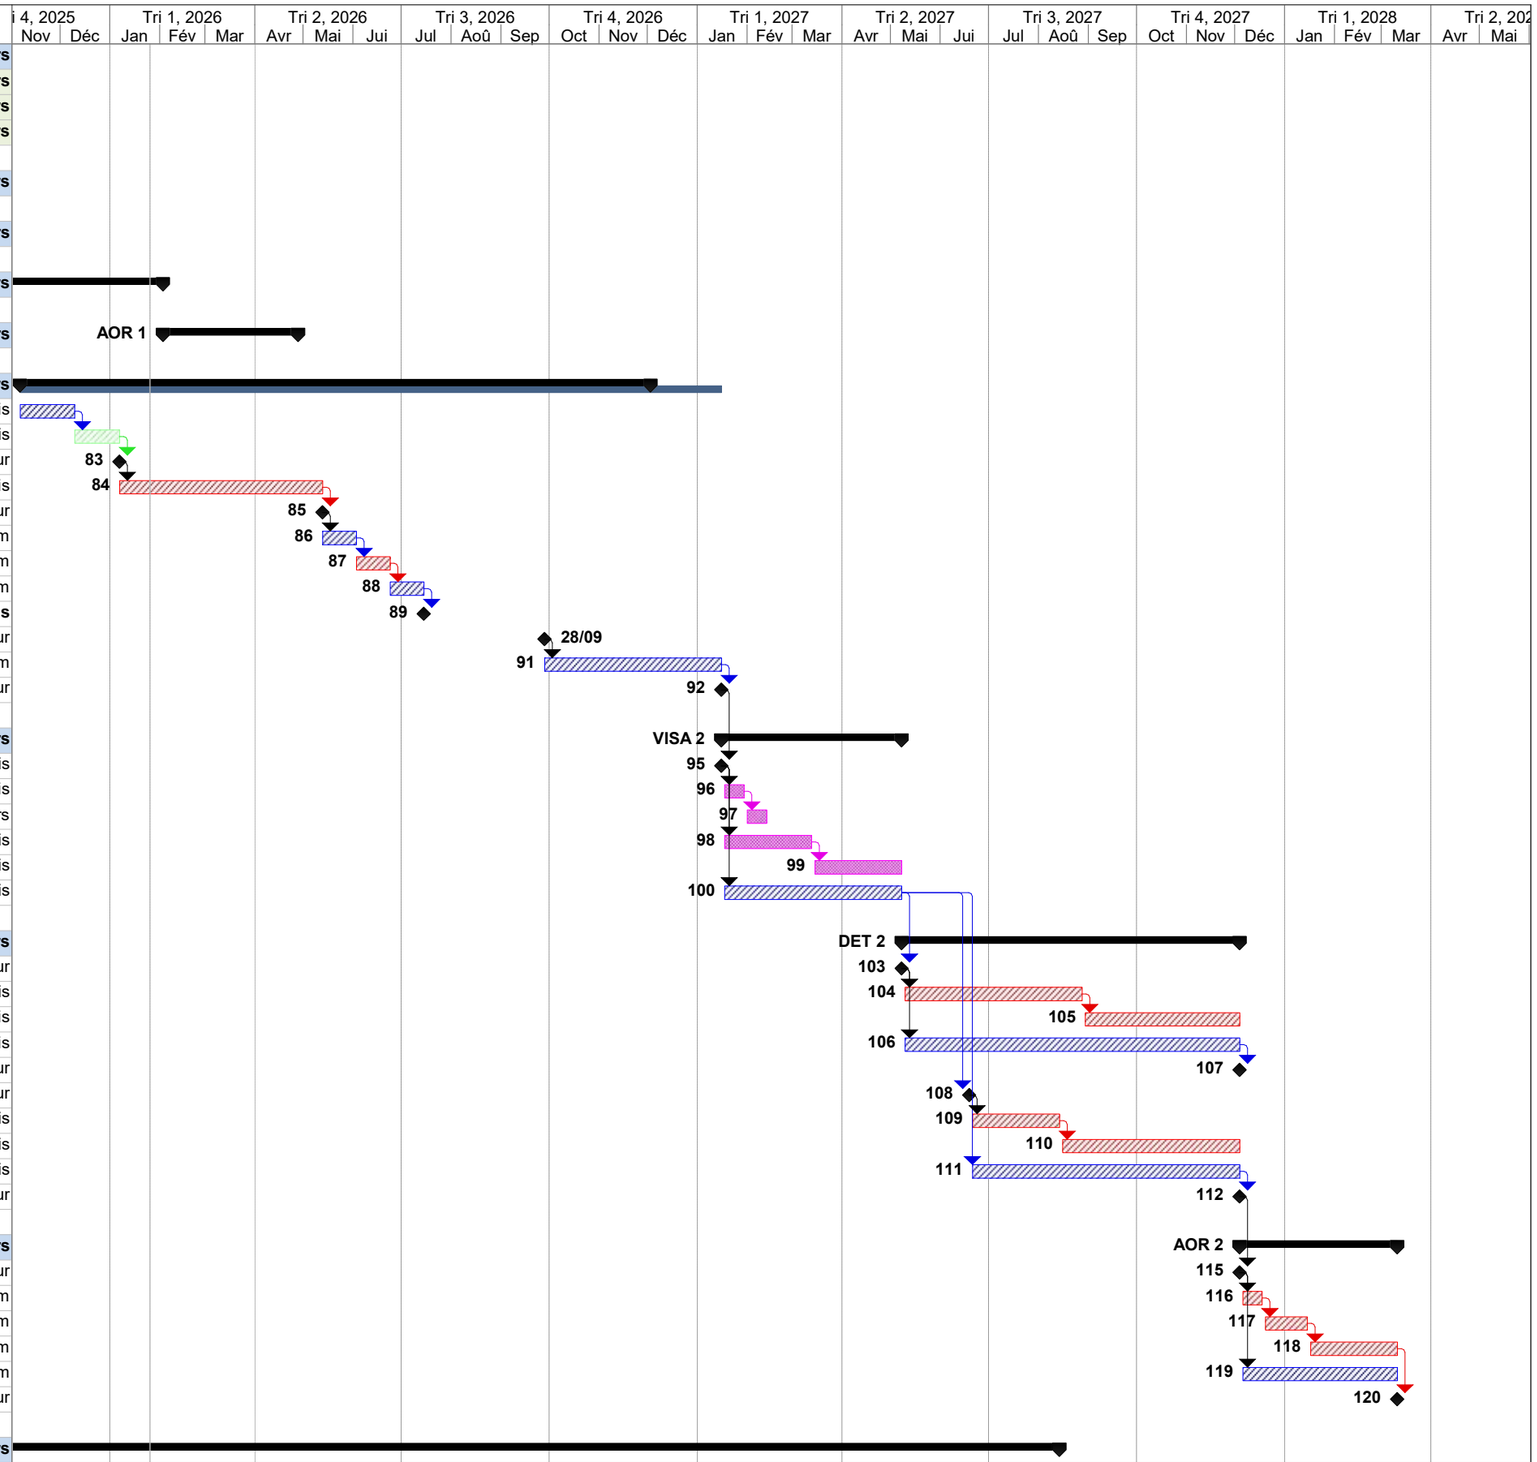

Projet : Projet1
Date : Lun 26/01/26

Tâche MOE	Jalon	Tâche inactive	Durée uniquement	Avancement
Tâche MOA	Récapitulative	Tâche inactive	Report récapitulatif manuel	Échéance
Tâche Entreprises	Récapitulatif du projet	Jalon inactif	Récapitulatif manuel	
Tâche services de l'état	Tâches externes	Récapitulatif inactif	Début uniquement	
Fractionnement	Jalons externes	Tâche manuelle	Fin uniquement	
